

青野沢川河川災害復旧工事（その1）

2017年8月 工事だより


工期：2014年12月17日 ~
2018年3月23日

工事進捗状況

工種	進捗率	備考
河川土工	75.5 %	掘削、盛土
護岸工	46.4 %	基礎工、法覆護岸他
排水工	0.0 %	水路、管路、樹他
付属構造物工	29.4 %	階段他
構造物撤去工	68.4 %	無筋コン、鉄筋コン
地盤改良工	100.0 %	地盤改良
樋門・樋管本体工	82.4 %	樋門・樋管4基
鋼橋上部	78.5 %	鋼単純非合成箱桁橋他
橋梁下部	100.0 %	橋台2基、場所打ち杭
構造物撤去工	100.0 %	旧橋撤去
仮設工	75.3 %	工事用道路、水替え他

トピックス

港橋の桁架設が完了しました！

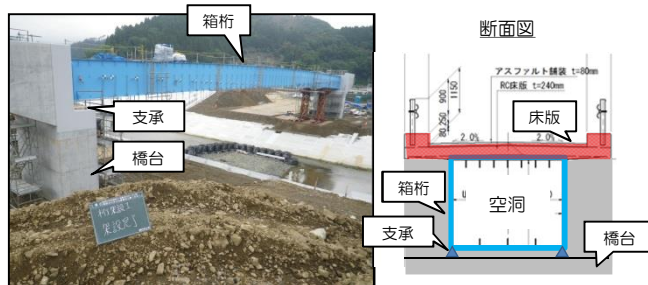

港橋の桁架設が完了しましたので、今後は床版（車や人が載るところ）を施工していきます。床版に作用する荷重は、箱桁→支承→橋台→場所打ち杭→支持地盤へと力が伝達していきます。



施工状況



全景写真

港橋は、上部工の橋桁架設を行いました。今後は床版工を行います。河口部では、重力式擁壁を築造中です。大沢第二橋架け替え工事（国交省）が着工しましたので、国道45号線周りの形も徐々に変わってきます。

港橋上部工



箱桁内部 ボルト締付状況

重力式擁壁



型枠組立

仮締め切り工



鋼矢板打設状況

樋管工



樋門④完成

法覆護岸工



ブロック据付状況

盛土工



右岸橋台部 盛土状況

工事担当者から一言



工事担当 福原 幸司

7月末からこちらの現場に赴任しました。栃木県出身の27歳です。趣味は、スノーボードです。

この現場に来る前は、気仙沼市の三陸道の工事を行っていました。河川工事は初めてですが、順調に工事が進められるよう努力していきます。よろしくお願ひ致します。



切土掘削



橋台工

連絡先

事務所 住所：気仙沼市唐桑町出山240-5

電話：0226-31-3201 FAX：0226-31-3510

ホームページ： <https://www.takenaka-doboku.co.jp/aonosawa/index.html>
