

# 青野沢川河川災害復旧工事（その1）

## 2017年10月 工事だより

工期：2014年12月17日 ~  
2018年3月23日

### 工事進捗状況

工種	進捗率	備考
河川土工	86.3 %	掘削、盛土
護岸工	47.0 %	基礎工、法覆護岸他
排水工	0.0 %	水路、管路、樹他
付属構造物工	53.3 %	階段他
構造物撤去工	76.7 %	無筋コン、鉄筋コン
地盤改良工	100.0 %	地盤改良
樋門・樋管本体工	100.0 %	樋門・樋管4基
鋼橋上部	93.4 %	鋼単純非合成箱桁橋他
橋梁下部	100.0 %	橋台2基、場所打ち杭
構造物撤去工	100.0 %	旧橋撤去
仮設工	88.1 %	工事用道路、水替え他

### お知らせ


#### ・上下水道の切り替えを行いました。

水道や下水の流れに異常がある場合、竹中土木  
TEL:0226-31-3201までご連絡下さい。

上下水道を法面上へ迂回させました



#### ・道路の一部切り替えを行います。

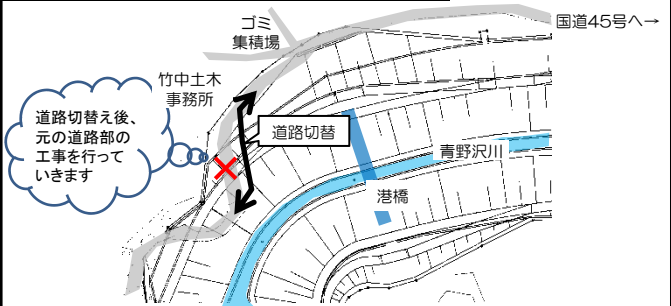

### 施工状況



全景写真

港橋は完成し、足場解体を行っています。  
右岸側は橋台周りの法覆護岸工を進めています。  
上流部左岸は、河川内護岸工事が完了しました。  
河口部は、市の防潮堤工事との取り合い部以外は概ね完了し、仮締切りも撤去しました。

港橋上部工 (No.4)



ガードレール設置

取付け工 (左岸No.0+30)



船着き場 被覆シート

仮締め切り工 (右岸No.7)



鋼矢板打設

護岸基礎工 (右岸No.3+25)



基礎矢板打設

法覆護岸工 (右岸No.4)



被覆ブロック据付

構造物撤去工 (右岸No.7)



旧ローソン擁壁撤去

### 施工業者にQ&A



和田建総業 澤里悠吾 (職長)

盛土工や法覆護岸工等を担当している和田建総業さんに話を聞きました。

Q: 会社は北海道の小樽市だそうです。どんなところですか？ 気仙沼に来てみての感想は？

A: 小樽市も港町で、気仙沼市と似ているかもしれません。  
気仙沼はメカジキがとても美味しくてびっくりしました！

Q: 本工事では、他の現場と比べて、どんなところが大変ですか？

A: 海や川の近くでの掘削があり、湧水対策にとっても苦労しています。

Q: 工事で工夫したり、気を付けている点がありますか？

A: 川や海を極力汚さないように気を付けています。  
また、安全第一で事故を起こさないように心掛けています。

重力式擁壁 (左岸No.0+30)



海面より深い所に作る構造物は、水替えが大変です！

### 連絡先

事務所 住所：気仙沼市唐桑町山240-5  
電話：0226-31-3201 FAX：0226-31-3510  
ホームページ：https://www.takenaka-doboku.co.jp/aonosawa/index.html

人と地球の架け橋に

